

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10)

Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.
(обновление текста от 14.08.2017)

- Выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка на всех этажах, устройство кровли, монтаж окон и балконных дверей. Выполнены наружные сети водопровода, канализации и тепловой трассы.
- Завершается остекление балконов.
- Выполняются сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы, «слабые токи».
- Выполняются работы по устройству цементной стяжки, отделочные работы в квартирах и местах общего пользования.

Фото от 14.08.2017



Вид на секции 2-1 со Областной ул.



Вид на секции 7-1 с Областной ул.



Вид на секции 11-7 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-8 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 11-9 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 5-10 со двора



Вид на секции 1-5 со двора



Вид на секции 5-10 со двора



Вид на секции 1-5 со двора

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15) Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г. (обновление текста от 14.08.2017)


Выполняются устройство монолитных железобетонных конструкций и укладка кирпичной кладки.

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
1 секция	18 этаж	2 этаж
2 секция	16 этаж	2 этаж
3 секция	17 этаж	2 этаж
4 секция	17 этаж	2 этаж
5 секция	18 этаж	2 этаж
6 секция	17 этаж	2 этаж
7 секция	18 этаж	2 этаж
8 секция	19 этаж	2 этаж
9 секция	18 этаж	2 этаж

14.08.2017 Фото



Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.

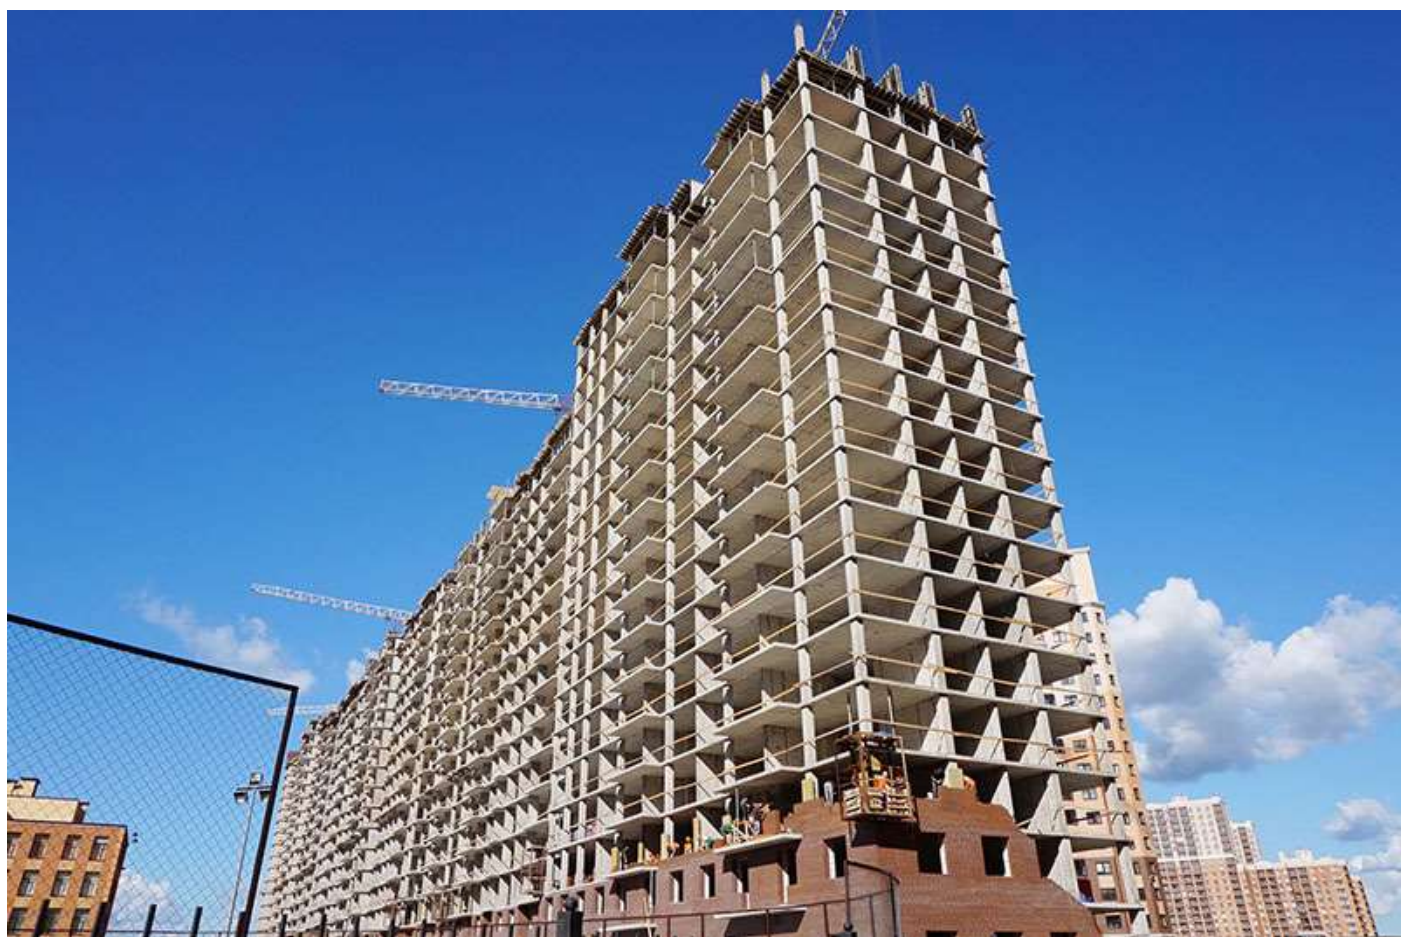

Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 6-1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 9-8 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 9-1 со стороны Областной ул.



Вид на секцию 1 со стороны Областной ул.



Вид на секции 2-7 со стороны Каштановой ал.
